Monteringsanvisning

Jordkjeller 200 × 500

1. Bruksområde og produktbeskrivelse

Natural Fridge jordkjeller 200 × 500 er en ferdig plastkjeller med skrå inngang for oppbevaring av grønnsaker, frukt, drikkevarer, hermetikk og andre emballerte matvarer. Kjelleren leveres helt klar for nedgraving.

Skallet er produsert ved rotasjonsstøping av mattrygg polyetylen som en helstøpt konstruksjon og er forsterket med avstivningsribber. Inne i skallet er det montert en solid stålramme som samtidig forsterker veggene. Skallet trenger ingen ekstra vanntetting eller korrosjonsbeskyttelse.

Inngangen er skrå og har dobbel lukking: et ytre plastlokk og en indre isolert dør med lås. Inne i kjelleren er det hyller i fire nivåer, gulv av fuktbestandig kryssfiner, metallstige, naturlig til- og avtrekksventilasjon (avtrekksrør Ø110 mm og to tilluftsrør Ø75 mm), LED-belysning og værstasjon.

Målskisse

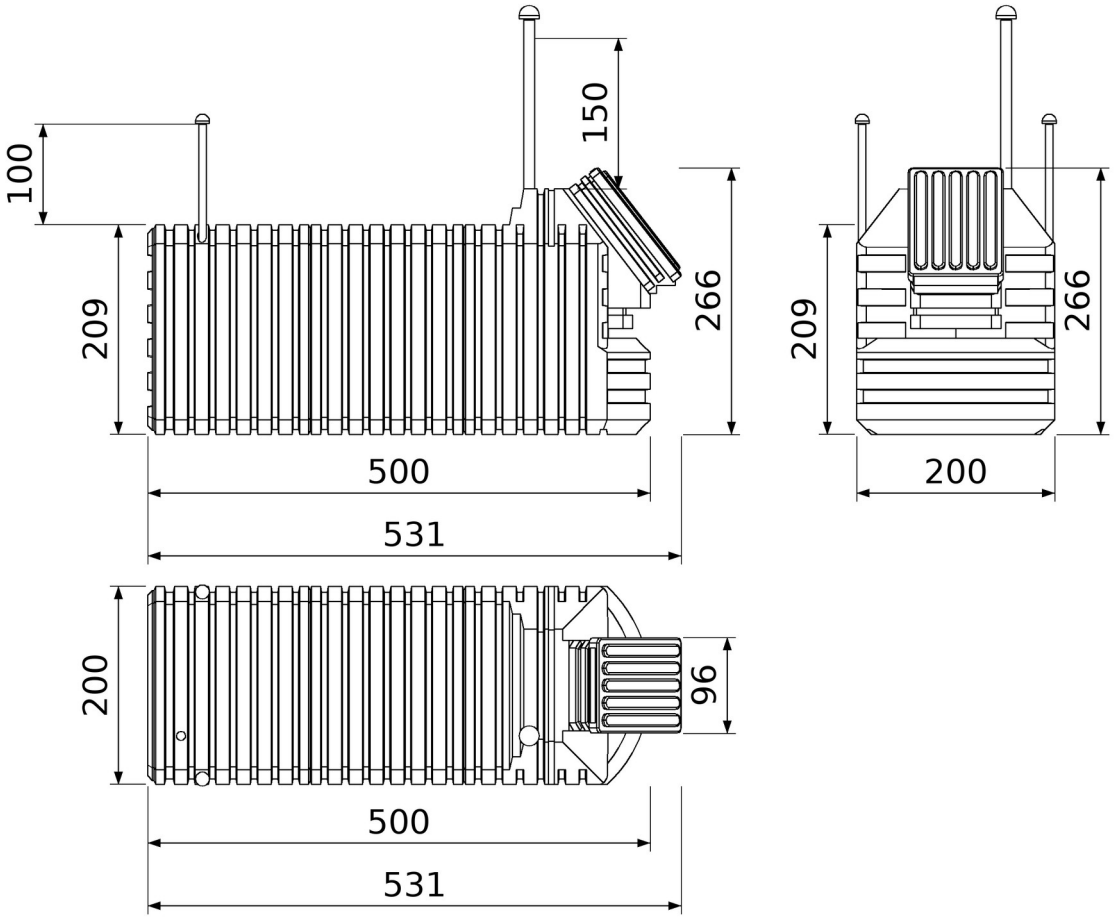

Jordkjeller 200 × 500 — tre projeksjoner, mål i centimeter

Faktiske mål kan avvike med ±3 % fra målene på tegningen på grunn av krymping i polyetylenet.

Hovedmål

Parameter	Verdi
Skallets mål, lengde × bredde	500 × 200 cm
Lengde med skrå inngang	531 cm
Skallets høyde	209 cm
Høyde over forhøyningen	245 cm
Ytre lokk, planmål	137 × 96 cm
Inngangsåpning	80 × 120 cm
Innvendig volum	18,7 m³
Hyller	4 nivåer, dybde 30–35 cm, areal 13,1 m²
Ventilasjonsrør	avtrekk Ø110 mm — 1,5 m; to tilluft Ø75 mm — 1,0 m hver
Byggegrop, lengde × bredde × dybde	540 × 240 × 170 cm
Skallets vekt	ca. 1850 kg

Advarsel

Maksimalt jordlag over kjelleren er 50 cm over isolasjonslaget. Det anbefales å bruke lett matjord.

Innvendig utstyr

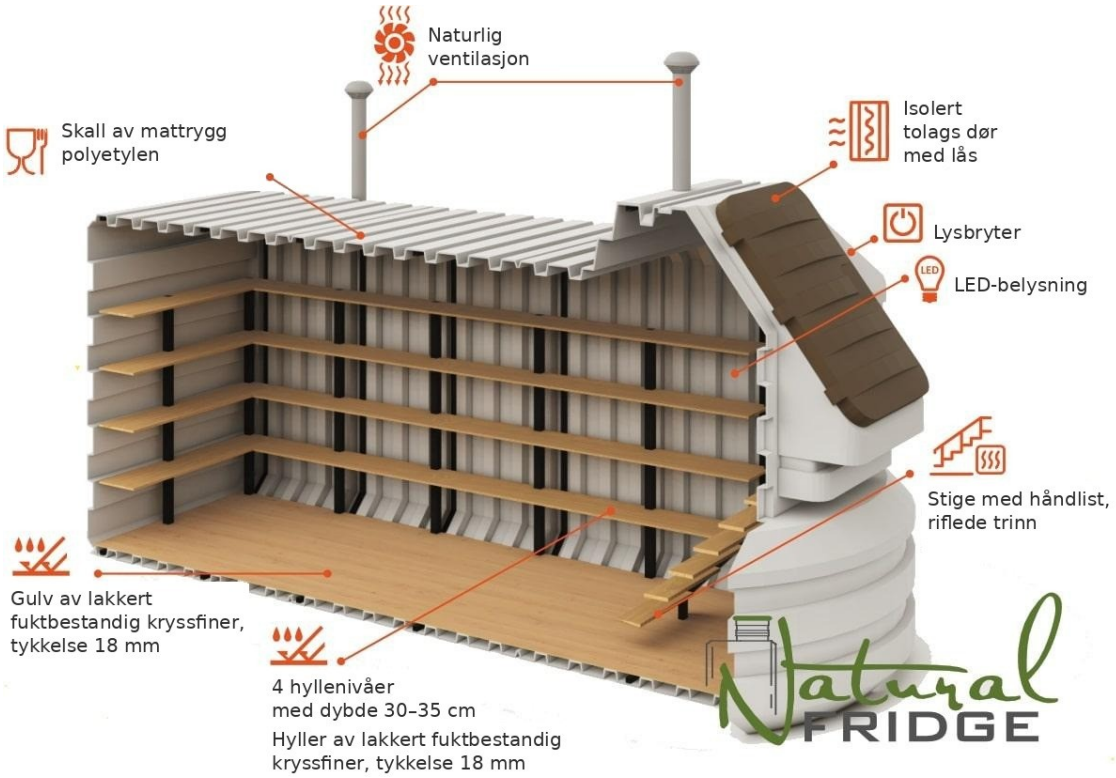

Kjelleren i snitt: hyller, stige, belysning og ventilasjon

2. Leveringsomfang

- Kjellerskall med stålramme — 1 stk.
- Hyller av fuktbestandig kryssfiner — 4 nivåer
- Gulv av fuktbestandig kryssfiner — 1 sett
- Metallstige med tretrinn — 1 stk.
- Ytre plastlokk — 1 stk.
- Ventilasjonsrør Ø110 mm, 1,5 m, med hette — 1 stk.
- Ventilasjonsrør Ø75 mm, 1,0 m, med hette — 2 stk.
- T-rør 100 × 50 × 100 mm for kabelutføring — 1 stk.
- LED-belysning med bryter — 1 stk.
- Strømforsyning 220 / 12 V — 1 stk.
- Værstasjon (temperatur og luftfuktighet) — 1 stk.

Ikke inkludert i leveransen

Tørrbetong, armering, XPS-isolasjon, fiberduk, sand til tilbakefylling.

Jordkabel 2 × 2,5 mm² eller 2 × 4 mm² og trekkerør Ø20 mm.

Spennstropper med kapasitet 4 t og lengde 7 m — 2 stk. (eller plastbelagte ståltau med Ø minst 10 mm).

Gravearbeider, kran eller lastebilkran for plassering av skallet.

3. Elektrisk anlegg

Kjelleren er utstyrt med LED-belysning 12 V med bryter på innsiden. Strømmen kommer fra strømnettet 220 V via en strømforsyning 220 / 12 V som omformer vekselstrøm til likestrøm.

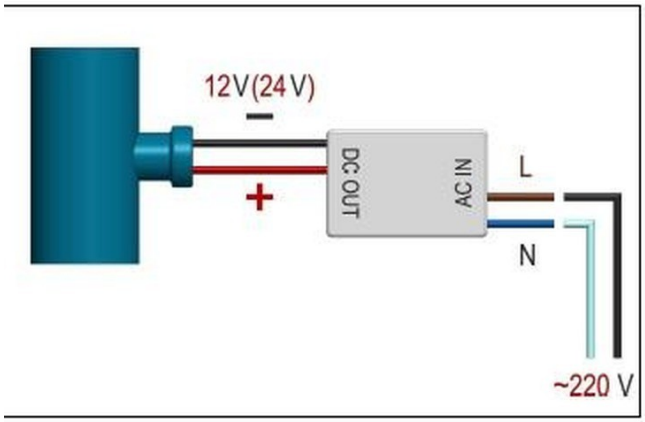

Koblingsskjema for belysningen: kabelutføring gjennom T-rør 100 × 50 × 100 mm, strømforsyning 220 / 12 V

Fra kjelleren til tilkoblingspunktet på strømnettet legges en jordkabel 2 × 2,5 mm² eller 2 × 4 mm². Det anbefales å legge kabelen i et trekkerør av polyetylen Ø20 mm.

Kabelen for strømtilkoblingen føres ut fra innsiden av kjelleren gjennom et grått T-rør 100 × 50 × 100 mm, montert i foten av avtrekksrøret: kabelen går gjennom sideavgreningen på T-røret, som har kabelnippel. På skjemaet er T-røret vist til venstre. T-røret inngår i leveransen.

Viktig

Kontroller polariteten (+ / −) før strømmen slås på.

Alt arbeid på strømnettet 220 V skal utføres av en autorisert elektriker.

4. Montering og nødvendige materialer

Den nedre delen av kjelleren graves ned ca. 1,55 m under terrengnivå. På denne dybden utsettes skallet for store jordtrykkrefter. De er enda større ved høyt grunnvannsnivå og i leirjord, som beveger seg ved tele. Monter derfor kjelleren nøyaktig etter denne anvisningen. Før arbeidet starter, må du fastslå grunnvannsnivået og jordtypen på tomten.

4.1. Materialer per enhet

Materiale	Mengde
Masse gravd ut fra byggegropen	22,0 m³
Tørrbetong til bunnplate 540 × 240 × 15 cm	1,94 m³
Tørrbetong til omfylling av skallet, lag 20 cm, høyde 88 cm	3,41 m³
Tørrbetong totalt	ca. 5,4 m³
Armering Ø12 til bunnplaten, langsgående jern c/c 20 cm	12 stk. × 5,3 m = 63,6 m / 57 kg
XPS 100 mm — toppflate og forhøyning	9,26 m² — 13 plater 0,6 × 1,2 m
XPS 50 mm — langsider og kortender 120 cm ned, front, inngang	18,14 m² — 26 plater 0,6 × 1,2 m
Fiberduk	ca. 33 m²
Sand til tilbakefylling og haug	ca. 7,4 m³
Lett matjord over isolasjonen, lag 35 cm	ca. 11,3 m³

Mengdene er beregnet ut fra 3D-modellen av produktet, uten tillegg for svinn. Legg til 5–10 % ved bestilling.

4.2. Tørrbetong

Det brukes ferdigblandet jordfuktig betong (tørrbetong) i fasthetsklasse C8/10–C12/15. Blandingen legges ut i lag på 30–40 cm, og hvert lag fuktes jevnt med vann og komprimeres — slik får tørrbetongen raskere full fasthet.

4.3. Verktøy og sikkerhet

Ved tilbakefylling av kjelleren må anleggsmaskiner ikke brukes nærmere enn 1 m fra skallet. Kjøretøy må ikke ferdes nærmere enn 1 m fra kjelleren langs hele omkretsen. Komprimer fyllmassen inntil veggene bare med håndverktøy.

4.4. Monteringstrinn

Trinn 1. Byggegrop

Byggegropen skal være 540 × 240 cm i bunnen og 170 cm dyp fra terrengnivå. Gropen er 20 cm større enn skallet på hver side. Med denne dybden blir kjelleren gravd ned slik at underkanten av den skrå inngangen ligger ca. 5 cm over terrengnivå: da kommer ikke regn- og smeltevann inn i kjelleren. Byggegropens vegger skal være loddrette og ha samme mål i hele høyden. Utgravd masse er ca. 22,0 m³.

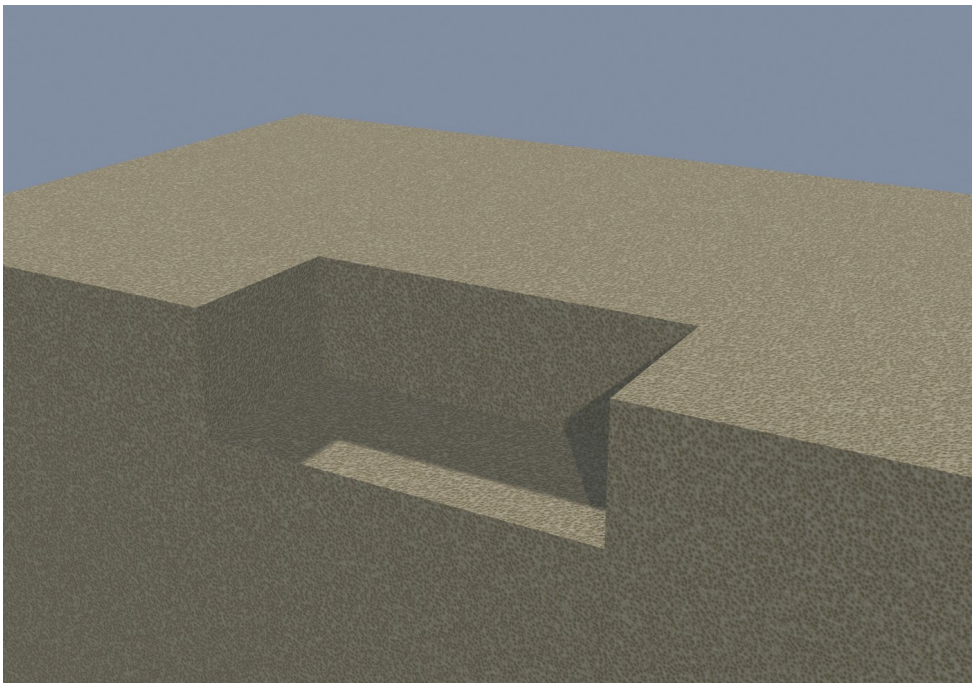

Trinn 1. Byggegrop 540 × 240 cm, dybde 170 cm

Trinn 2. Bunnplate av tørrbetong

I bunnen av byggegropen lages en bunnplate av tørrbetong på 540 × 240 cm med tykkelse 15 cm. Først legges et lag på 10 cm, og på dette legges langsgående armeringsjern Ø12 mm c/c 20 cm langs langsiden: 12 jern à 5,3 m. Øverst legges et lag på 5 cm. Forbruk av tørrbetong — 1,94 m³.

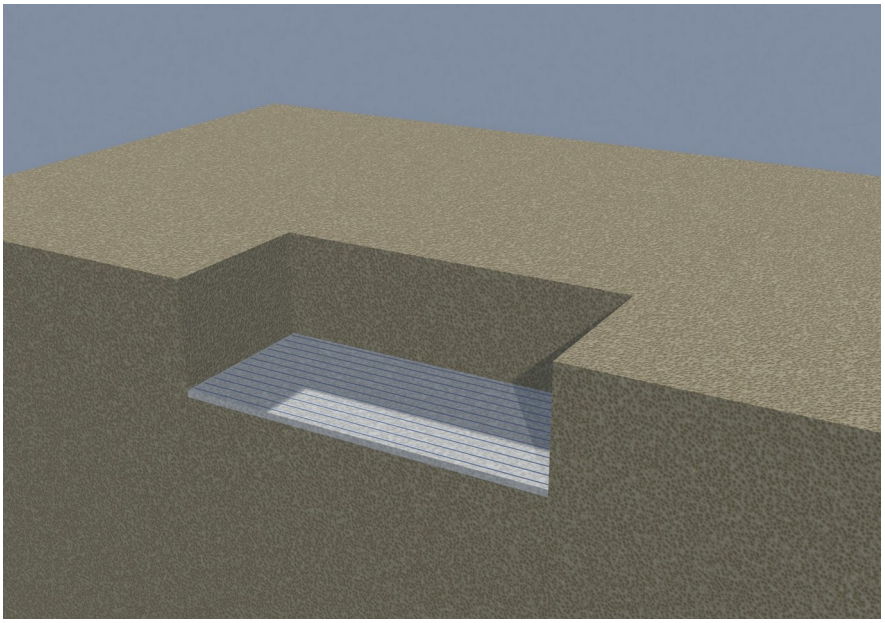

Trinn 2. Lag med tørrbetong 10 cm og langsgående jern Ø12 mm c/c 20 cm

Merk. Tverrgående jern er ikke nødvendig. I stedet for langsgående jern kan det brukes et armeringsnett av Ø12 mm stål med maskevidde 20 × 20 cm.

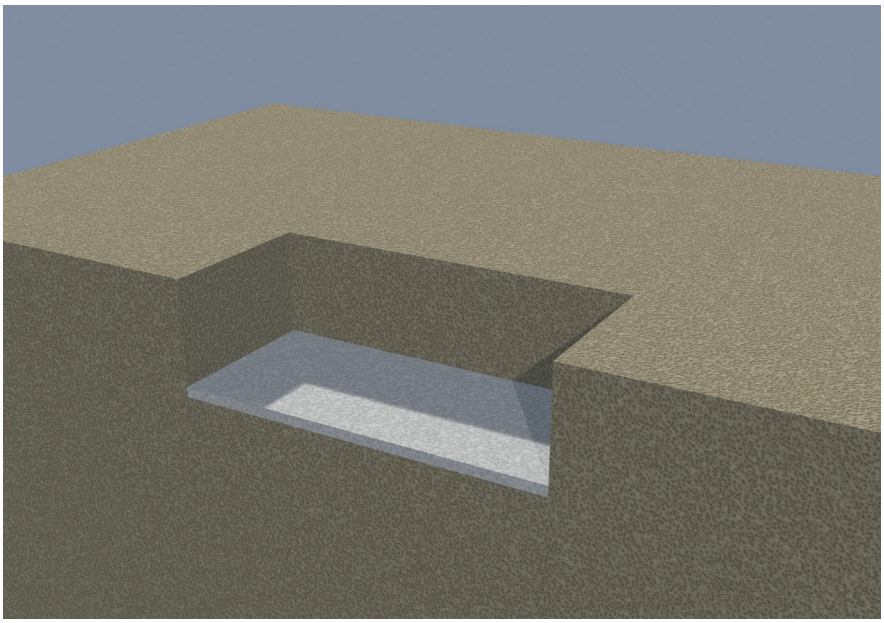

Trinn 2. Bunnplaten er ferdig, tykkelse 15 cm

Støp inn løkker eller ankere i bunnplaten for spennstroppene.

Trinn 3. Plassering av skallet

Skallet senkes ned på bunnplaten med kran eller lastebilkran og plasseres midt på bunnplaten. Skallet festes til bunnplaten med to spennstropper eller ståltau.

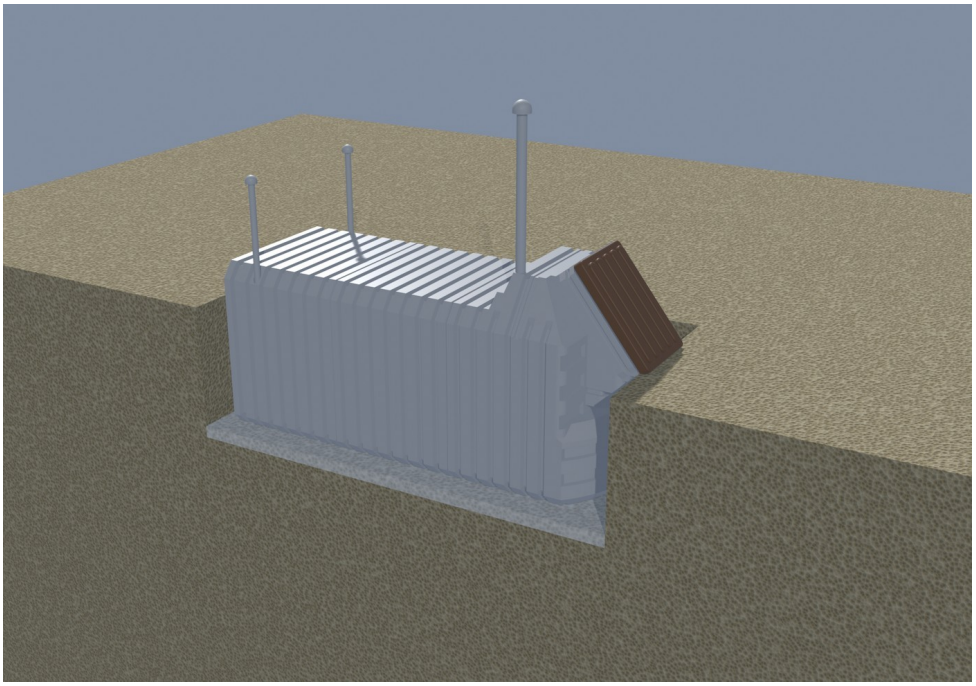

Trinn 3. Skallet er plassert på bunnplaten

Trinn 4. Ventilasjon

Ventilasjonsrørene settes loddrett i stussene på skallet og lukkes med hetter. Avtrekksrøret Ø110 mm, 150 cm høyt, står i den fremre delen av kjelleren, på forhøyningen ved inngangen, og stikker ca. 1,4 m over haugen: det trekker ut luft fra den øvre delen av kjelleren. Det kobles til kjelleren via et T-rør 100 × 50 × 100 mm, og gjennom T-rørets sideavgrening føres den elektriske kabelen ut (avsnitt 3).

I den bakre delen av kjelleren står to tilluftsrør Ø75 mm, hvert 1 m høyt — symmetrisk, ett på venstre og ett på høyre side av skallet. De stikker ca. 0,6 m over haugen og tilfører frisk luft til den nedre delen av kjelleren.

Om vinteren ved sterk kulde (under −20 °C) og om sommeren i varme (over +30 °C) må lufttilførselen

begrenses — lukk tilluftsrørene delvis. Det anbefales å isolere avtrekksrøret for å hindre kondens i det.

Trinn 5. Omfylling av skallet med tørrbetong

Ved montering av denne kjelleren er det påkrevd å fylle tørrbetong rundt den nedre delen av skallet: omfyllingen motvirker oppdriften fra grunnvannet. Fyll tørrbetong rundt skallet på alle sider i lag på 30–40 cm. Hvert lag fuktes med vann og komprimeres. Tørrbetongen skal være minst 20 cm tykk rundt hver vegg. Omfyllingen utføres opp til 88 cm fra underkanten av skallet — til underkanten av isolasjonen på langsidene. Forbruk — 3,41 m³.

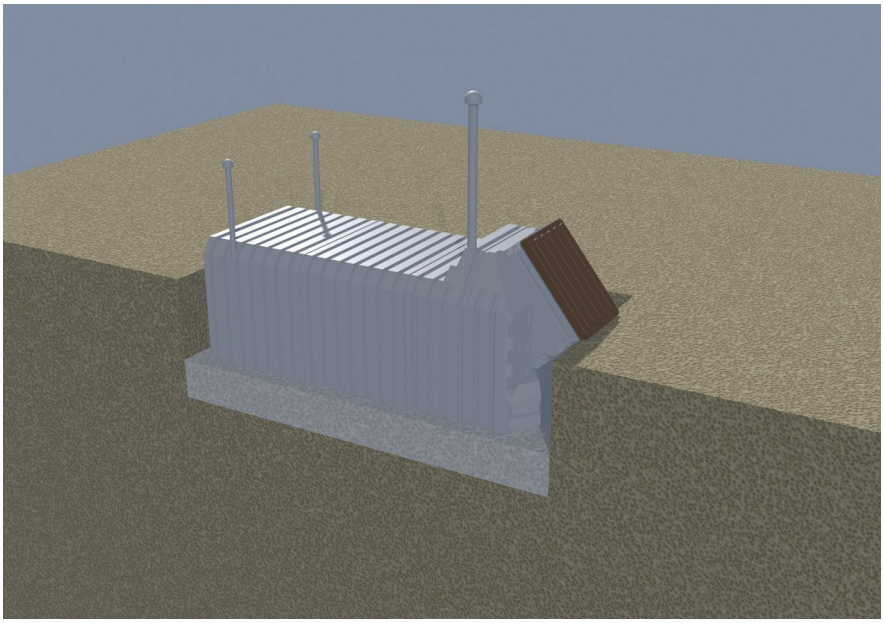

Trinn 5. Første lag tørrbetong, 40 cm

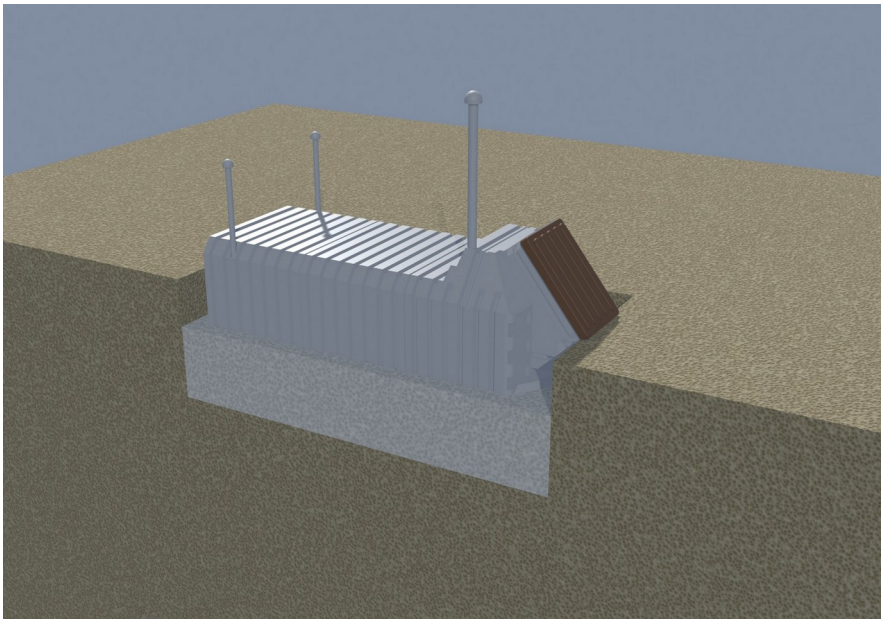

Trinn 5. Omfylling med tørrbetong opp til 88 cm

Trinn 6. Isolering

For å redusere temperatursvingningene inne i kjelleren isoleres toppen av skallet med ekstrudert polystyren (XPS). Toppflaten, platået på forhøyningen og dens skrå vegger — plater på 100 mm, 9,26 m², 13 plater 0,6 × 1,2 m. Platene på toppen skal dekke endene av sideplatene.

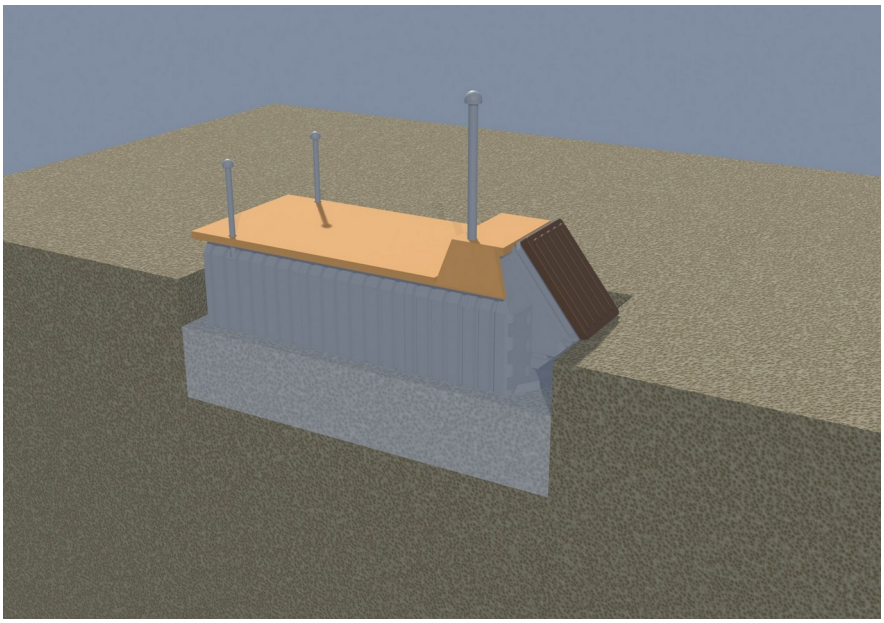

Trinn 6. Isolering av toppflaten og forhøyningen, XPS 10 cm

Langsidene og den bakre kortenden isoleres med plater på 50 mm 120 cm ned fra toppflaten, og fronten og veggene i den skrå inngangen med de samme platene på 50 mm. Totalt 18,14 m², 26 plater. Legg platene tett i tett, og forskyv skjøtene i hjørnene.

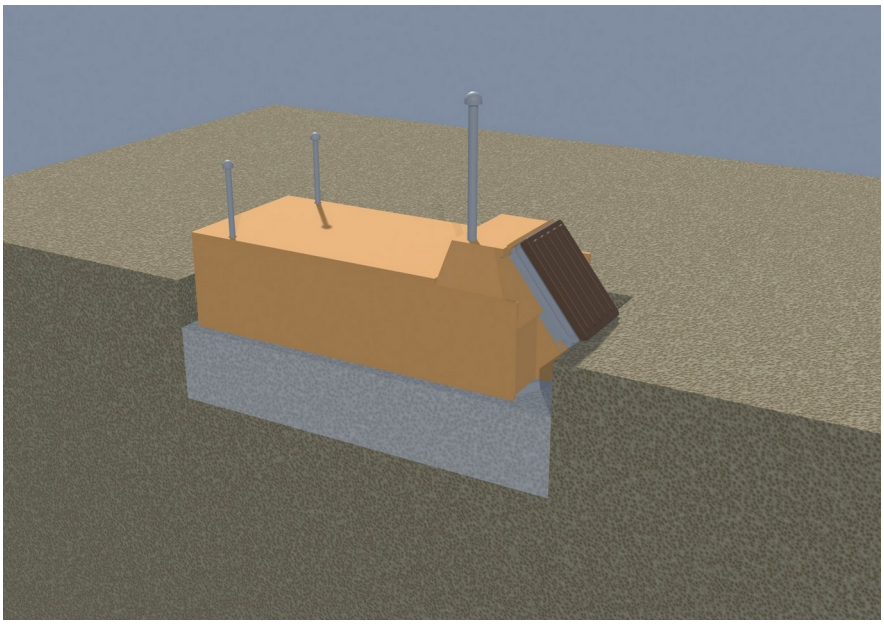

Trinn 6. Isolering av langsider, kortender, front og inngang, XPS 5 cm

Merk

Hvis det i ditt område ofte er varmere enn +30 °C om sommeren, grunnvannsnivået er svært lavt og jorden er tørr, anbefaler vi å isolere sideveggene 120 cm ned fra kjellerens toppflate.

Hvis klimaet i ditt område er kaldere, eller grunnvannet står høyere om sommeren og i tillegg kjøler den nedre delen av kjelleren, er det nok å isolere sideveggene 60 cm ned fra kjellerens toppflate. Forbruket av XPS 50 mm blir da 11,36 m², 16 plater 0,6 × 1,2 m.

Trinn 7. Fiberduk

All isolasjon dekkes med fiberduk med 10–15 cm omlegg. Fiberduken beskytter isolasjonen og hindrer at jord tetter igjen skjøtene. Forbruk ca. 33 m².

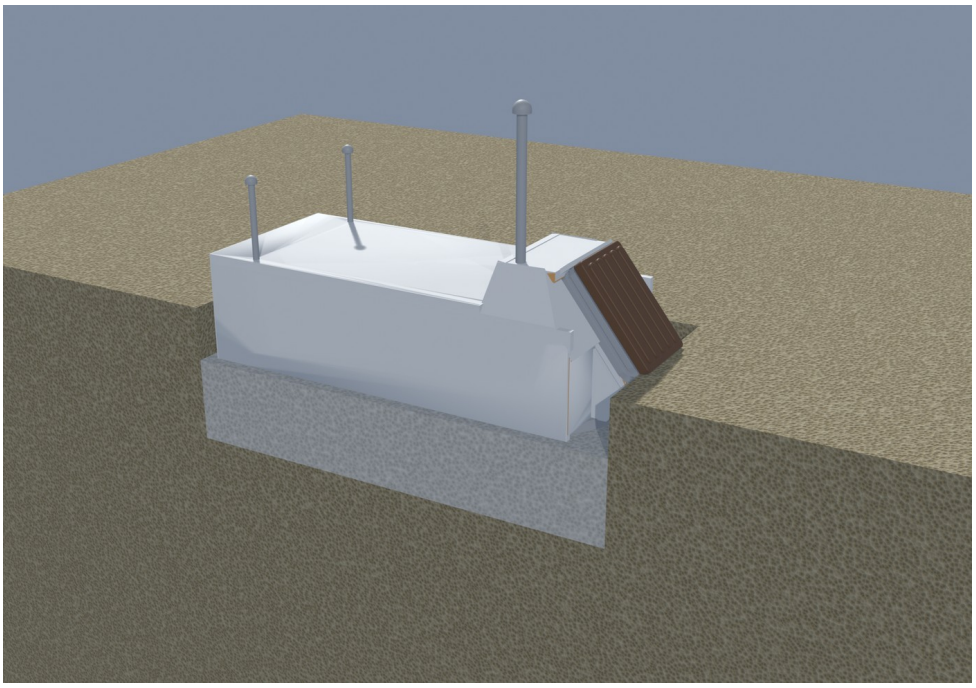

Trinn 7. Isolasjonen er dekket med fiberduk

Trinn 8. Tilbakefylling med sand

Rommet mellom skallet og gropveggene fylles med sand opp til terrengnivå, i lag på 30 cm som komprimeres med håndverktøy. Deretter formes en sandhaug opp til toppen av isolasjonen med slake, avrundede skråninger. På inngangssiden er skråningen bratt og følger dørens helning. Sandmengde ca. 7,4 m³.

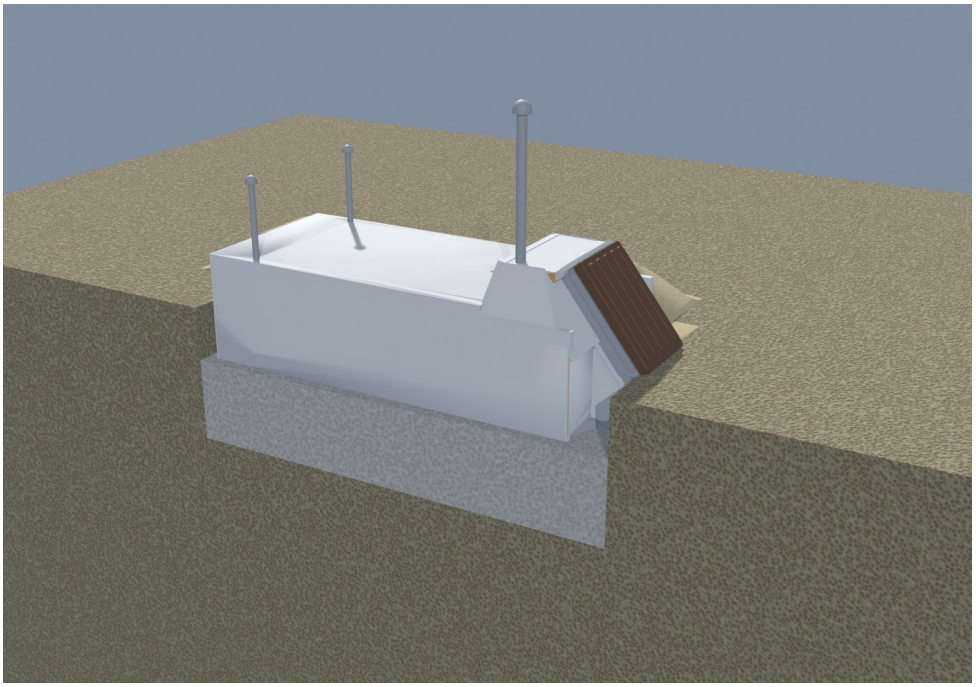

Trinn 8. Tilbakefylling med sand, vist i snitt

Trinn 9. Jord og plen

Over isolasjonen legges lett matjord i et lag på 35 cm — ca. 11,3 m³. Maksimalt jordlag over kjelleren er 50 cm over isolasjonen. Bruk ikke tung leirjord til tilbakefyllingen.

På inngangssiden har haugens overflate samme helning som døren og ligger i hele sin lengde 5 cm lavere enn dørens overflate.

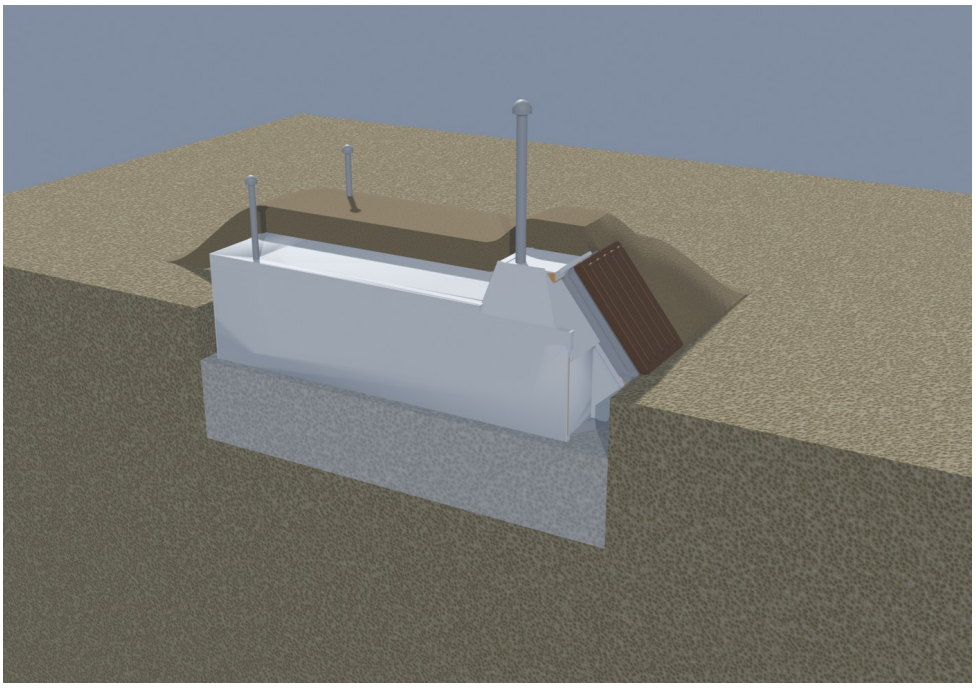

Trinn 9. Tilbakefylling med jord, vist i snitt

Over haugen er bare det ytre lokket på den skrå inngangen og tre ventilasjonsrør med hetter synlige.

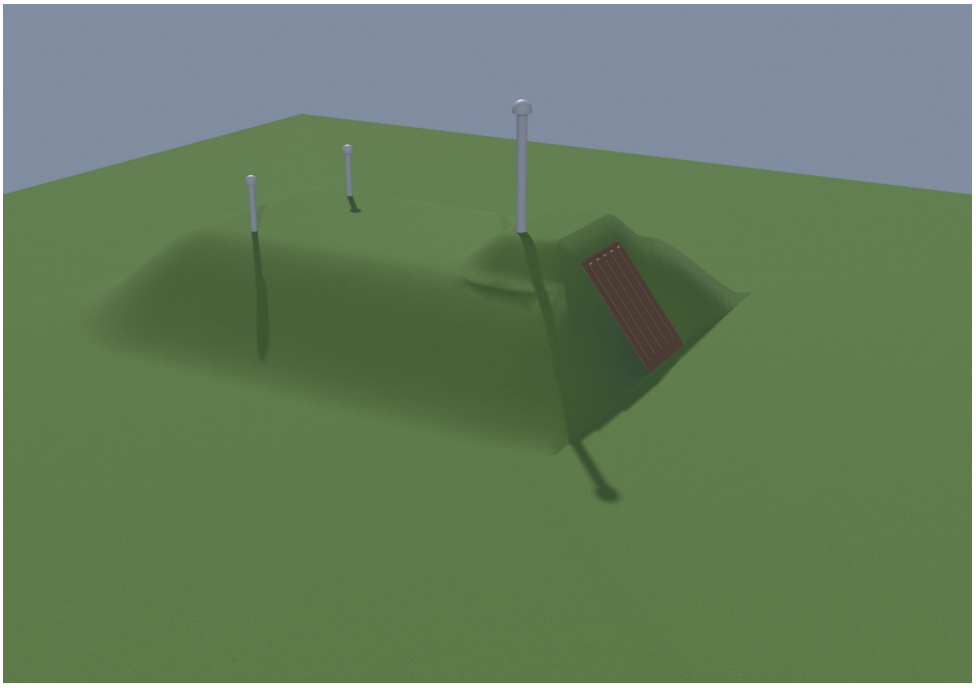

Ferdig kjeller etter tilbakefylling og reetablering av plenen

Etter monteringen

I løpet av noen uker etter monteringen vil jordtrykket presse skallets vegger inn mot rammen og hyllene; mellom rammeelementene kan veggene bøye seg litt innover. Dette er normalt.

Ved stor temperaturforskjell kan det dannes kondens på døren og veggene. Den fordamper av seg selv og trenger ikke fjernes. Ved sterk kulde kan det dannes rim på innsiden av lokket; skjer dette ofte, isoler døren fra innsiden med isolerende skum.

5. Garantivilkår

I garantiperioden har kjøperen rett til gratis reparasjon av produktet ved produksjonsfeil. Garantien omfatter at utstyret fungerer, kvaliteten på det mattrygge materialet i skallet, gulv og hyller samt mekaniske og sveisede forbindelser.

Garantien er begrenset til produksjonsfeil og omfatter ikke:

- normal slitasje på deler, naturlig aldring, skader på maling og overflate som følge av bruk og ytre miljø, blant annet aggressive stoffer, værforhold, industriell forurensning, kjemikalier, plantesaft, stein og salt
- ubetydelige geometriske avvik som ikke påvirker produktets kvalitet, blant annet målavvik som skyldes særtrekk ved rotasjonsstøping
- skader forårsaket av naturkatastrofer, brann, forhold i husholdningen og force majeure
- skader forårsaket av tredjepart, blant annet under levering eller ved montering i strid med anvisningen
- skader og deformasjoner som følge av endret geometri etter at monteringen er fullført
- korrosjon som følge av riper og avskallet maling på rammen og forbindelsene

Garantien bortfaller dersom produktet er reparert, eller forsøkt reparert, av personer (firmaer) uten forutgående konsultasjon med produsenten.

Komponent	Garantitid
Produktet som helhet	24 måneder
Værstasjon, LED-belysning	12 måneder
Forventet levetid	minst 50 år

Ta vare på denne anvisningen

Anvisningen trengs ved vedlikehold av produktet og ved garantihenvendelser.

Produsent

Firma	BPR-PLASTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adresse	Konduktorska 18, lok. 7, 02-775 Warszawa, Polska
Postadresse	ul. Bruzdowa 125 A / 12, 02-991 Warszawa, Polska
NIP / REGON / KRS	PL9662114813 / 368194329 / 0000693472
Telefon	+48 730 750 773
E-post	info@nfridge.eu · info@ziemianka.com.pl
Nettsider	nfridge.eu · ziemianka.com.pl
	© 2026
